

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto_2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto .**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

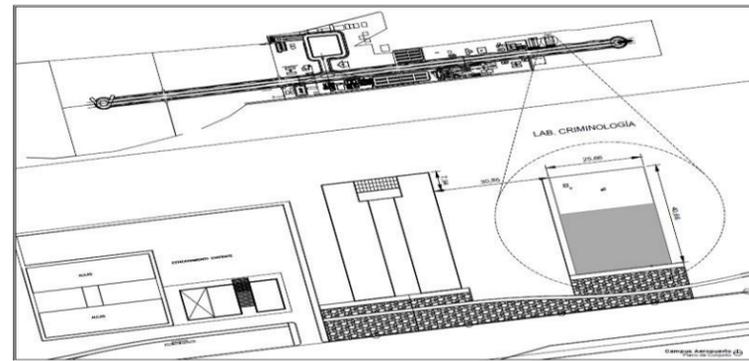

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Aeropuerto
Carretera a Chichimequillas s/n, Ejido Bolaños,
Querétaro, Qro. C.P.76140

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada lateral poniente

Comentarios de los trabajos realizados:

CONTRATO: CAAS-OB-014-2019-UAQ-OAG.

Se realiza el pago del anticipo al contratista el día 30 de Julio del presente; con esta fecha se da inicio a los trabajos de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

Estructura para colocacion de elevador tipo rampa, consiste en zapata de cimentacion y traveses de liga.

Colocación de canalón de placa de acero para recibir arcotecho de lámina. Se realizo el refuerzo en canalones, traveses de IPR y columnas de IPR.

Fabricación y colocación de escalera por medio de perfiles tipo C y escalones de ángulo con concreto armado en acabado lavado. Instalacion de piso en el primer nivel.

Instalacion de piso cerámico en formato de 60x60 cms en primer nivel, con junta en color gris

Colocacion de azulejo en muros de baños en primer nivel a un altura de 3.30 mts.

Colocacion de piso en baños en primer nivel.



F3: Fachada lateral oriente



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
